HWDK 작업관리 앱 사용설명서

생산운영관리 · 2026-11-12 개정

11/12 바뀐 것

- **생산통합지표** — 늦은 호선 카드는 **주황(주의)** · **빨강(위험)**으로 표시. 카드에 **표준 공정률**과 **다음 절점 날짜**가 나옵니다. (1번 ①)
- **주간계획** — 담당 반장 칸이 없어지고 **본 인원(필수)** + **지원 인원**을 적으면 **총원**이 자동으로 나옵니다. (3번 ②)
- **우선작업순위** — D-day가 실제 날짜보다 **7일 앞(목표일)** 기준입니다. 목표일이 지나면 **D+**로 표시됩니다. (4번)
- **홈 화면** — 1. 생산운영관리 옆에 **(반장 입력 · 직장 검토)**가 붙었습니다.

0 시작하기


휴대폰 인터넷(크롬 또는 삼성 인터넷)에서 아래 주소를 엽니다. 처음 한 번만 **홈 화면에 추가**해 두면 다음부터는 아이콘만 누르면 됩니다.

https://dkgeoje001-cyber.github.io/hwdk-instrument/

로그인

회원가입은 하지 않아도 됩니다 (계장공종 인원은 이미 등록됨).

1. **이름** 칸에 내 이름을 적습니다.
2. **비밀번호** 칸에 **사번**(출입번호)을 적습니다.
3. **[로그인]** 버튼을 누릅니다.

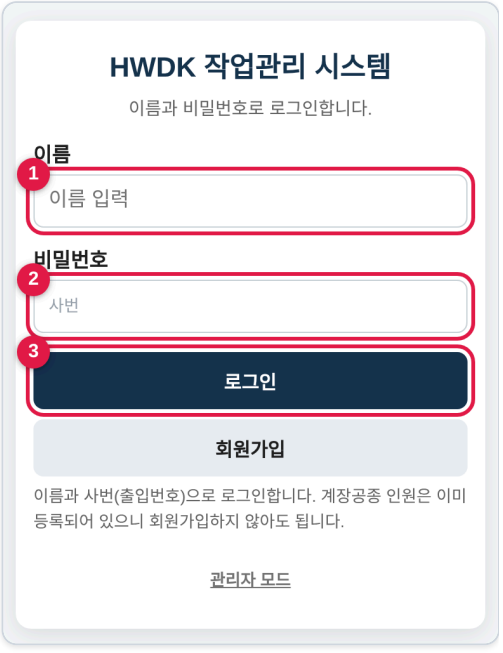

메뉴 고르기

로그인하면 나오는 화면의 **1. 생산운영관리 (반장 입력 · 직장 검토)** 칸에서 고릅니다. 사진의 빨간 번호가 아래 번호입니다.



번호	메뉴	언제 쓰나요
1	**생산통합지표**	매일 작업 등록 (가장 많이 씀) · 공정률 보기
2	**일일작업등록**	작업을 직접 골라 적을 때 (수기)
3	**주간계획입력**	매주, 다음 주 계획
4	**우선작업순위**	급한 블록 · 절점 일정 보기

처음 화면으로 돌아가려면 왼쪽 위 **[← 이전]** 또는 **[업무 선택]** 버튼을 누릅니다.

1 일일작업 등록 (기본) — 생산통합지표에서

매일 퇴근 전, 생산통합지표에서 오늘 한 작업을 찾아 누릅니다. 선종부터 작업까지 자동으로 골라지므로 **인원과 공정률만** 적으면 됩니다.

① 호선 고르기

홈에서 **[생산통합지표]** 버튼을 누른 뒤:

1. **선종** (LPG · LNG · VLCC)을 누릅니다.
2. **호선** 카드를 누릅니다. 카드의 %는 그 호선의 공정률입니다.


카드 색	뜻
○ 흰색	표준 공정률과 비슷함
● 주황 (주의)	표준보다 10%p 넘게 늦음
● 빨강 (위험)	표준보다 30%p 넘게 늦음

표준 % — 오늘 기준으로 이만큼은 되어 있어야 하는 공정률(엑셀 공정률 지표와 같은 기준). 그 아래 날짜는 **다음 절점**입니다: P.E 단계는 K/L, DOCK은 L/C, 안벽은 S/T, S/T가 지나면 D/L.




② STAGE 고르기

아래에 나오는 **STAGE** 카드(P.E · DOCK · 안벽) 중 오늘 일한 곳을 누릅니다.

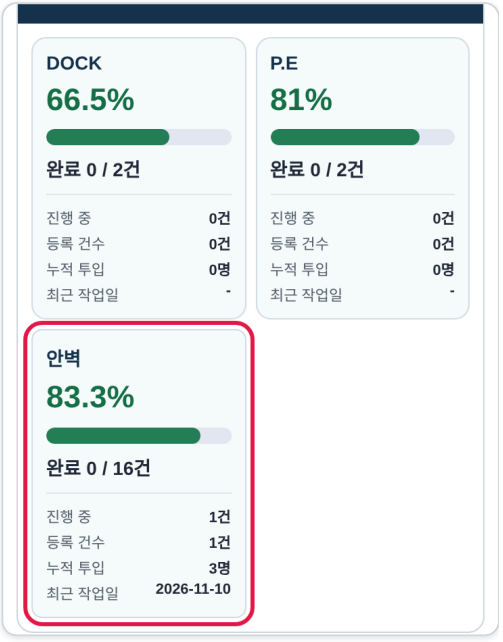

③ 작업 누르기

구역별 작업 목록이 열리면 오늘 한 **작업**을 누릅니다. 막대와 %는 지금까지의 공정률입니다.

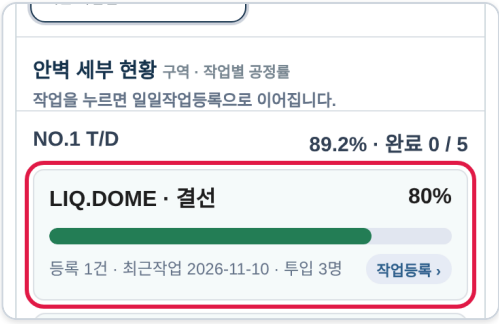

④ 골라진 내용 확인

일일작업등록 화면이 열리고 맨 위에 **생산통합지표에서 고른 작업**이 보입니다. 선종부터 작업까지 이미 골라져 있으니 **작업일**만 확인합니다.

SYSTEM 칸이 열리면 한 SYSTEM에 체크하고 **[선택 완료]**를 누릅니다.



⑤ 오늘 투입 인원 고르기

1. **반장 이름**을 누르면 그 반 명단이 펼쳐집니다.
2. 같이 일한 사람에 체크합니다 (반장 포함).
3. **[선택 완료]**를 누릅니다. 인원 수는 자동으로 맞춰집니다.


명단에 없는 사람은 **이름 직접 입력** 칸에 적고 **[추가]**를 누릅니다. 한 사람을 같은 날 여러 작업(여러 구역)에 넣어도 됩니다.



⑥ 공정률 적고 등록하기

1. **현재 공정률**을 숫자로 적습니다 (0~100, 다 끝났으면 100).
2. **비고**는 후속 호선에서 참고할 내용만 적습니다 (비워도 됨).
3. **[일일작업 등록]** 버튼을 누릅니다.


다른 작업도 했으면 맨 위 **[← 생산통합지표]**를 눌러 ①부터 다시 합니다.

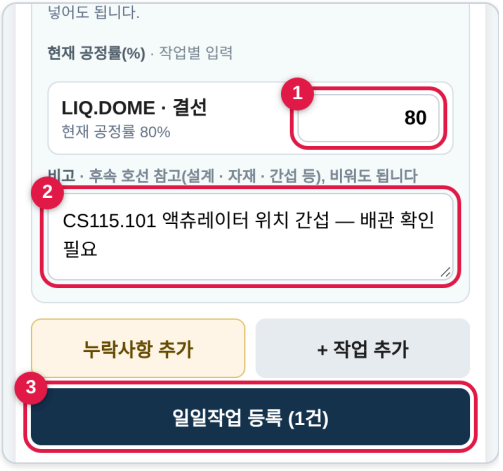

적은 비고는 다음 호선에서 보입니다

같은 선종 · STAGE · 구역 · 작업을 다른 호선에서 등록하면, 비고 칸 위 **노란 상자**에 앞 호선 비고가 **등록한 호선 번호**와 함께 나옵니다.


예: 2584호선에서 적은 비고가 2591호선 같은 작업을 등록할 때 보입니다. 작업 전에 꼭 읽어 보세요.

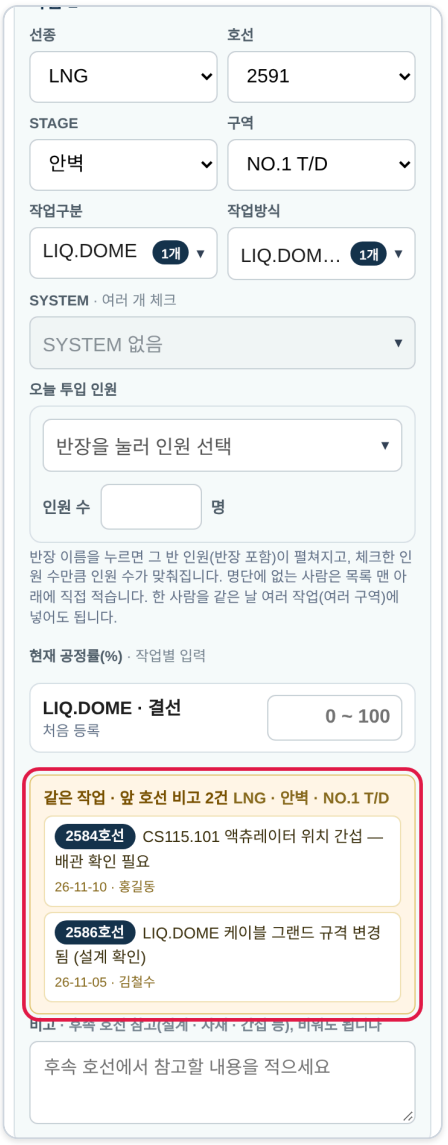

⑦ 등록한 것 확인 · 고치기

화면 위 **[등록 목록]** 탭을 누르면 등록한 작업이 보입니다. 내가 적은 것만 고칠 수 있습니다.

1. **[수정]** — 내용을 고칩니다.
2. **[삭제]** — 잘못 적은 것을 지웁니다.

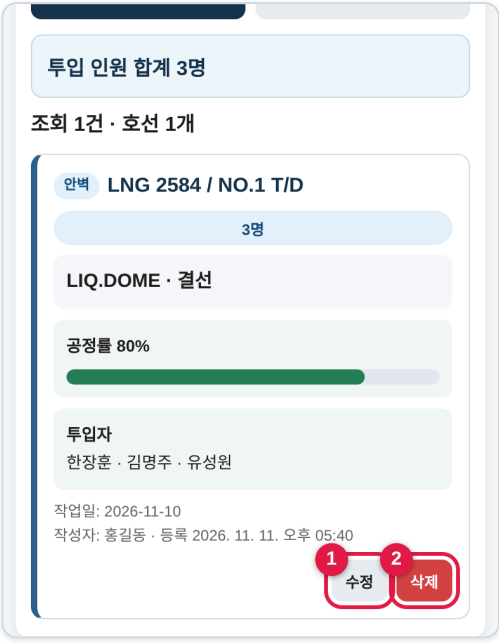

2 일일작업 등록 (수기) — 직접 고르기

생산통합지표에서 작업을 찾기 어려울 때는 홈에서 **[일일작업등록]**을 눌러 위에서부터 직접 고릅니다. 고르는 것만 다르고, 인원 · 공정률 · 등록은 1번과 같습니다.

① 호선 · 구역 고르기

1. **작업일** 확인 (오늘 날짜가 자동)
2. **선종** 고르기 (예: LNG)
3. **호선** 고르기 (예: 2584)
4. **STAGE** 고르기 (P.E · DOCK · 안벽)
5. **구역** 고르기 (예: NO.1 T/D)



② 작업구분 고르기

1. **작업구분** 칸을 누릅니다.
2. 한 작업에 체크합니다 (여러 개 가능).
3. **[선택 완료]**를 누릅니다.



③ 작업방식 고르기

1. **작업방식** 칸을 누릅니다.
2. 한 작업에 체크합니다.
3. **[선택 완료]**를 누릅니다.

SYSTEM 칸이 열리면 한 SYSTEM(VRC · GAS 등)에 체크하고 **[선택 완료]**. 없으면 넘어갑니다.



④ **그다음** — 투입 인원 · 공정률 · 등록은 1번의 ⑤ ~ ⑦과 똑같습니다. 다른 작업도 했으면 등록 전에 **[+ 작업 추가]**를 눌러 한 번에 같이 적을 수 있습니다.

3 주간계획입력 — 매주, 다음 주 계획

다음 주에 할 작업을 하나씩 적고 **[주간계획 등록]**을 누릅니다. 고르는 방법은 일일작업 등록(수기)과 같습니다.

① 계획 주 확인

1. **계획 주** — 다음 주가 자동으로 골라져 있습니다.
2. **다가오는 절점** — 계획 주와 그다음 주의 L/C · S/T · D/L 일정입니다. 계획을 적기 전에 한번 봅니다.



② 계획 적기

1. **선종 · 호선 · STAGE · 구역**을 차례로 고릅니다.
2. **작업구분 · 작업방식**을 고릅니다 (칸을 눌러 체크 → [선택 완료]).
3. **작업 요일**을 누릅니다 (여러 날 가능, 누른 날은 진하게 보임).
4. **본 인원**(우리 반, **필수**)과 **지원 인원**(지원 받는 인원, 없으면 비움)을 숫자로 적습니다. **총원**은 자동으로 더해집니다.
5. **[주간계획 등록]**을 누릅니다. 비고는 필요할 때만 적습니다.

본 인원을 비우면 등록되지 않습니다 (0명은 가능).



③ 계획이 여러 개일 때



1. **[+ 계획 추가]** — 계획 칸이 하나 더 생깁니다. 다 적은 뒤 한 번에 등록합니다.
2. **[누락 작업 추가]** — 목록에 없는 작업은 여기에 글로 적습니다.

---

④ 계획 목록 보기

화면 위 **[계획 목록]** 탭을 누릅니다. **내 이름** 버튼을 누르면 내 계획이 요일별로 나옵니다. 인원은 **총원 5명 (본 4 · 지원 1)** 처럼 나옵니다.

잘못 적은 계획은 **[삭제]**로 지운 뒤 다시 적습니다.



4 우선작업순위 — 급한 일정 보기

PE 블록 탑재일과 호선 절점(L/C · S/T · D/L)이 **급한 순서**대로 나옵니다. 앱에는 40일 안의 일정만 보이고, 전체는 엑셀 파일에 있습니다.

D-day는 실제 날짜보다 7일 앞(목표일) 기준 — 놓치지 않게 여유를 둔 것입니다. 카드에 **PE FINISH 11/13 · 목표 11/6**처럼 두 날짜가 나옵니다.

날짜	표시
11/6 (목표일)	D-DAY
11/7 ~ 11/13 (실제 날짜까지)	**D+1 ~ D+7** · 최긴급으로 맨 위
11/14 (실제 날짜 지남)	목록에서 빠짐

보는 법

1. **등급 버튼** — 누르면 그 등급만 봅니다.
2. **등급 표시** — 색으로 급한 정도를 알려 줍니다.
3. **[작업완료]** — 그 블록 · 절점 작업이 모두 끝났을 때만 누릅니다.



색	등급	목표일까지 남은 날
빨강	최긴급	0 ~ 7일 (D+ 포함)
주황	긴급	8 ~ 14일
노랑	보통	15 ~ 30일
보라	인도지연	절점이 지났는데 D/L 날짜가 없음
초록	여유	31일 이상

주의 — [작업완료]를 누르고 확인 창에서 [확인]을 누르면 목록에서 지워지고 **되돌릴 수 없습니다.** 잘못 눌렀으면 관리자에게 알려주세요. PE 블록 일정은 관리자가 입력합니다.

5 이럴 때는

이럴 때	이렇게 하세요
로그인이 안 됨	이름을 띄어쓰기 없이, 비밀번호는 사번(출입번호)으로. 그래도 안 되면 관리자에게 문의
목록에 구역 · 작업이 없음	아래 '목록에 구역 · 작업이 없을 때' 사진대로 글로 적기
잘못 등록함	아래 '잘못 등록했을 때' 사진대로 고치기
등록했는데 목록에 안 보임	화면 위 **[새로고침]** 버튼 누르기
처음 화면으로 가고 싶음	왼쪽 위 **[← 이전]** 또는 **[업무 선택]**
주간계획 등록이 안 됨	**[본 인원]**이 비어 있는지 확인 (필수 · 0명도 가능)
우선작업순위에 D+3 이 보임	목표일(실제 날짜 7일 전)이 3일 지났다는 뜻 — 실제 날짜가 지나면 사라짐

목록에 구역 · 작업이 없을 때 — 일일작업

1. 등록 화면 아래 **[누락사항 추가]** 버튼을 누릅니다.
2. 열린 칸에 선종 · 호선 · STAGE · **구역** · 작업을 글로 적습니다 (예: 구역 NO.5 C/HOLD).
3. **[누락사항 저장]** 버튼을 누릅니다.

여기 적은 내용은 생산통합지표에는 들어가지 않고, 관리자가 엑셀에서 따로 확인합니다.



목록에 구역 · 작업이 없을 때 — 주간계획

1. **[누락 작업 추가]** 버튼을 누릅니다.
2. 선종 · 호선 · STAGE · **구역** · 작업을 글로 적습니다.
3. **작업 요일**을 누릅니다.
4. **본 인원**(필수) · 지원 인원을 적습니다. 총원은 자동입니다.
5. **[누락 작업 저장]** 버튼을 누릅니다.



잘못 등록했을 때

내가 적은 것만 고칠 수 있습니다.

1. **[등록 목록]** 탭에서 고칠 기록의 **[수정]** 버튼을 누릅니다.
2. 작업일 · 공정률 · 투입 인원 · 비고 중 틀린 칸을 고칩니다.
3. **[수정 저장]** 버튼을 누릅니다.

호선 · 구역 · 작업이 틀렸으면 **[삭제]** 후 다시 등록합니다.

